

Dálnice D7

Dostavba D7 v úseku Slaný–Bitozeves

Ing. Václav Marvan (tel. 605 229 066)

18.10.2023




ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA CHOMUTOV

Praha – Slaný – Louny – Chomutov



Celková délka: 83,1 km
stav k 09/2023

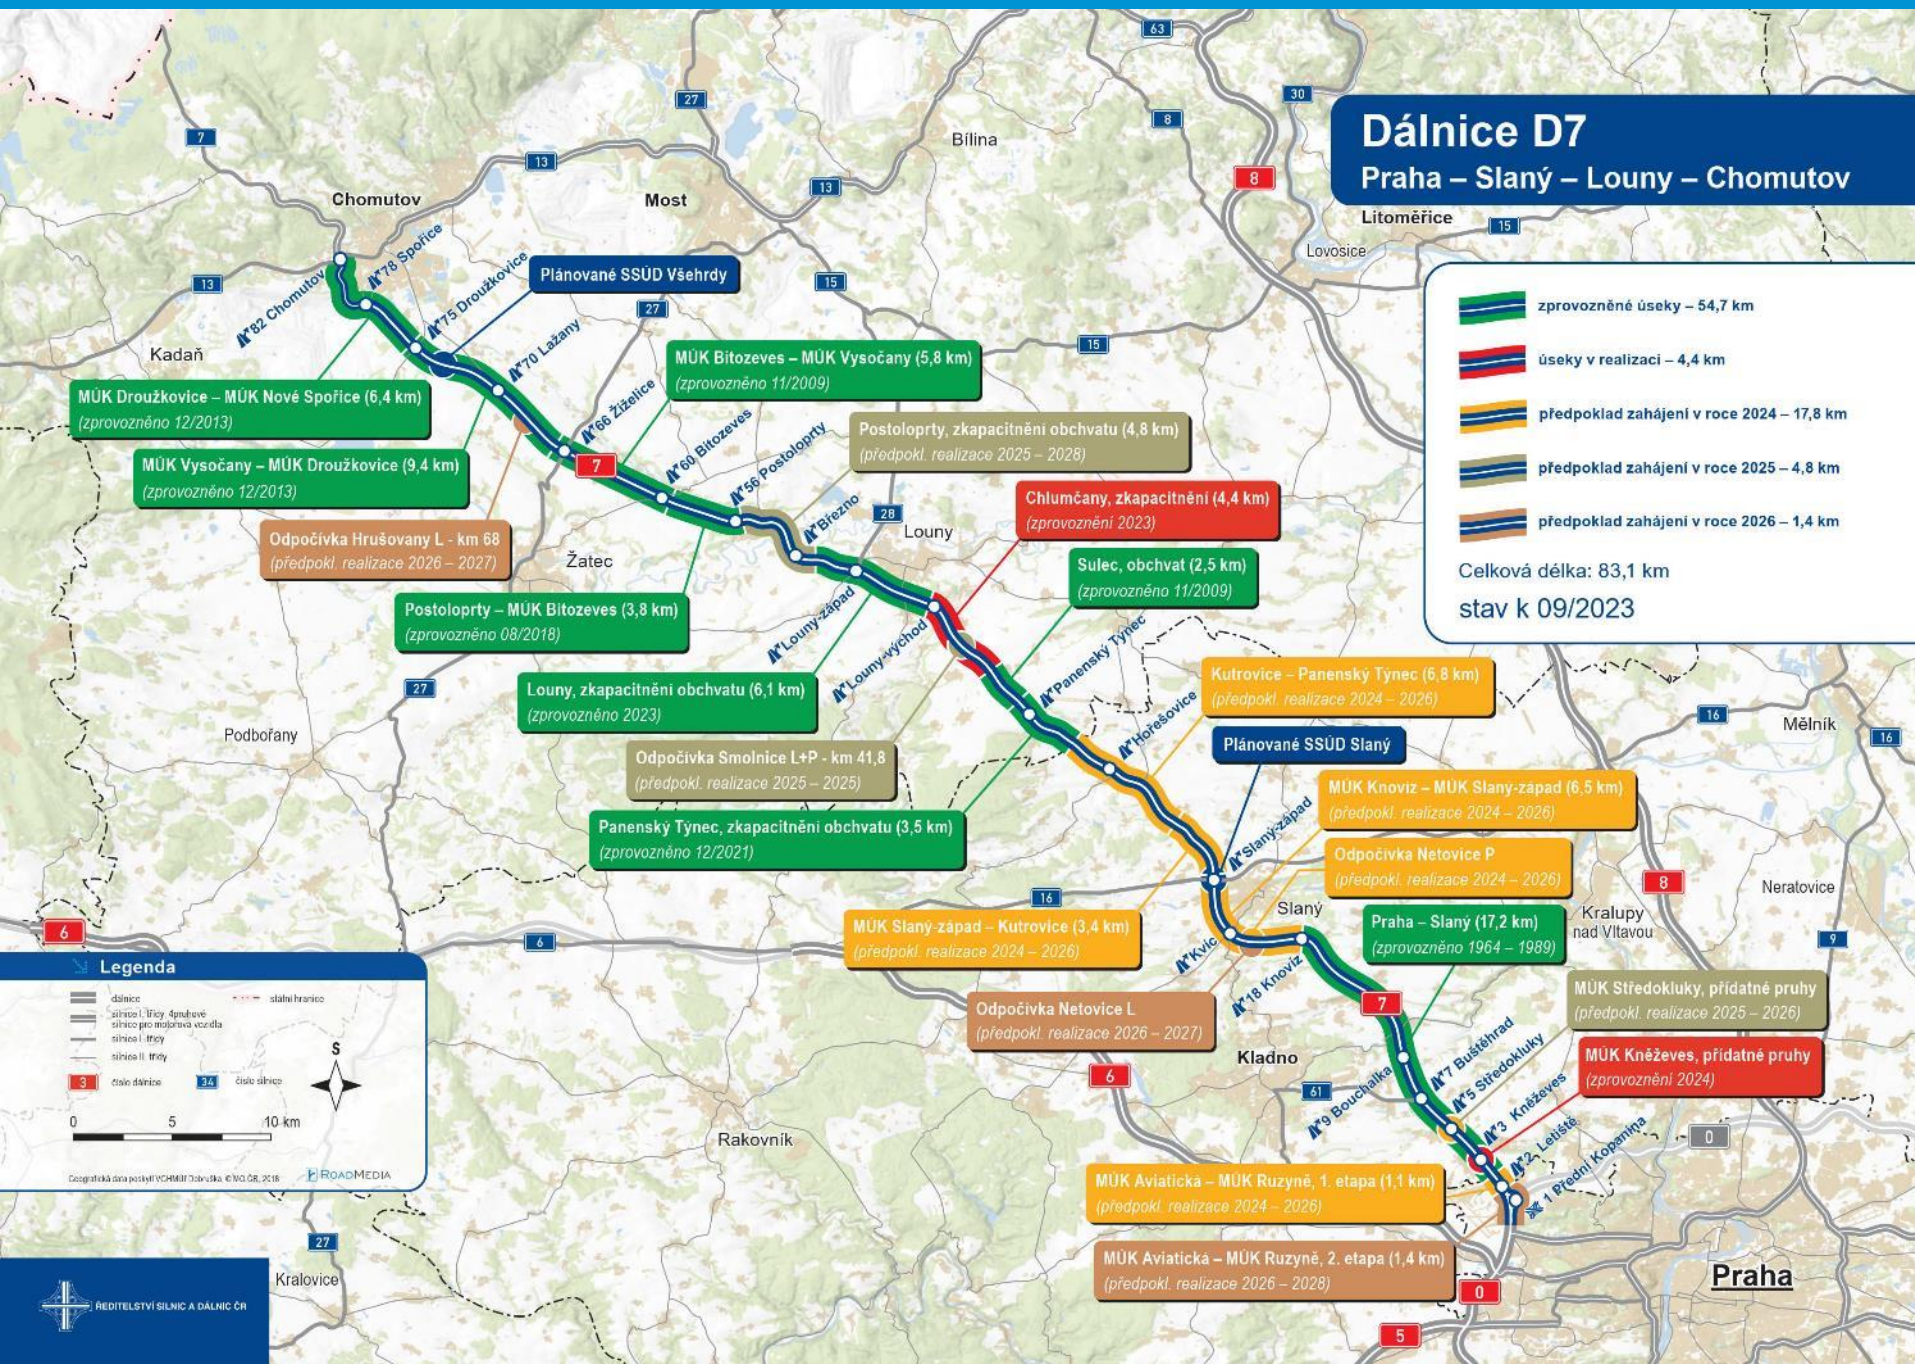

D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
12/2005	05/2007	06/2019	2023	2023	2024	2026

Stav	V přípravě
Délka (m)	6490
Kategorie	D 25,5/110
Mosty (dálniční)	4
MÚK	MÚK Kvíc, MÚK Slaný-západ
Zhotovitel DSP	PRAGOPROJEKT a.s.
Cena (bez DPH)	2 581 924 000 Kč

DSP

- Vydané stavební povolení na hlavní trasu (poslední 5.10.2023)

VD-ZDS


- Probíhá zpracování

Archeologický průzkum


- od 11/23-07/24

D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ


16.10.2023

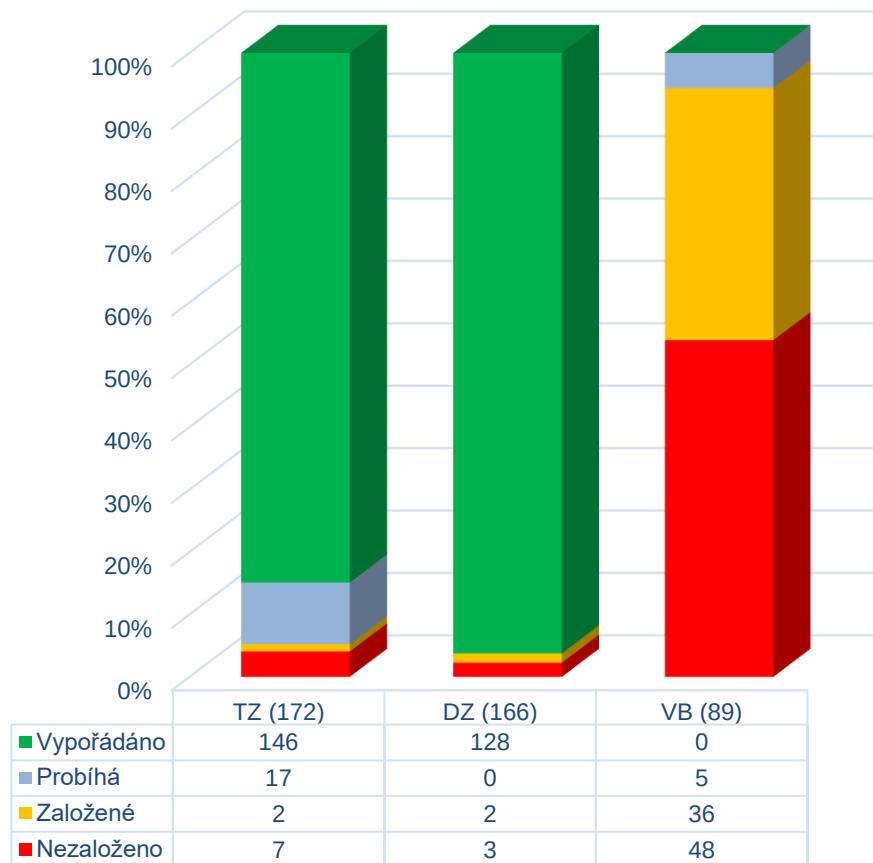

30.5.2023

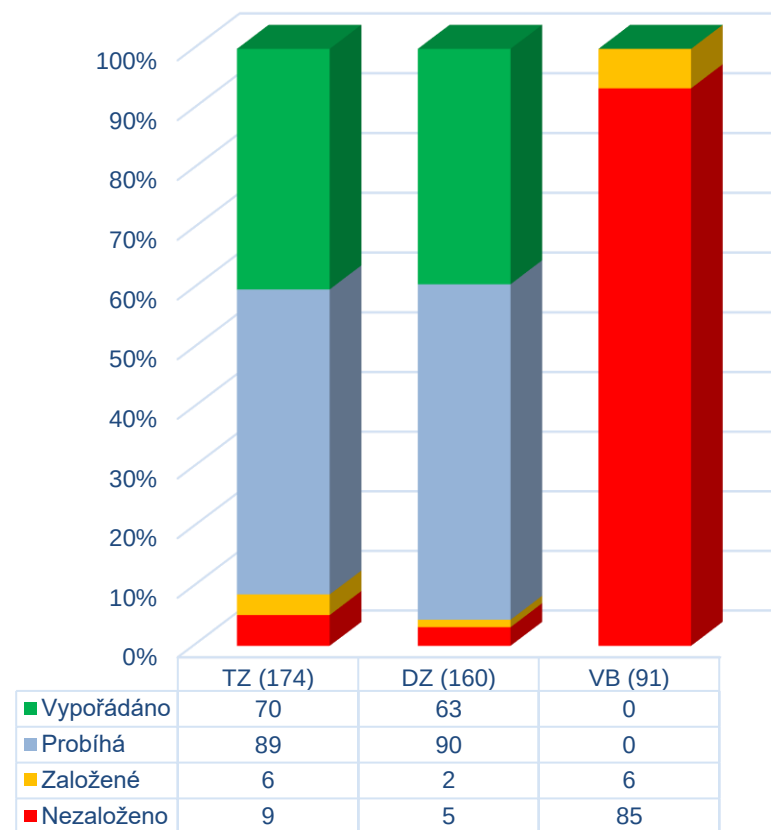

D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice

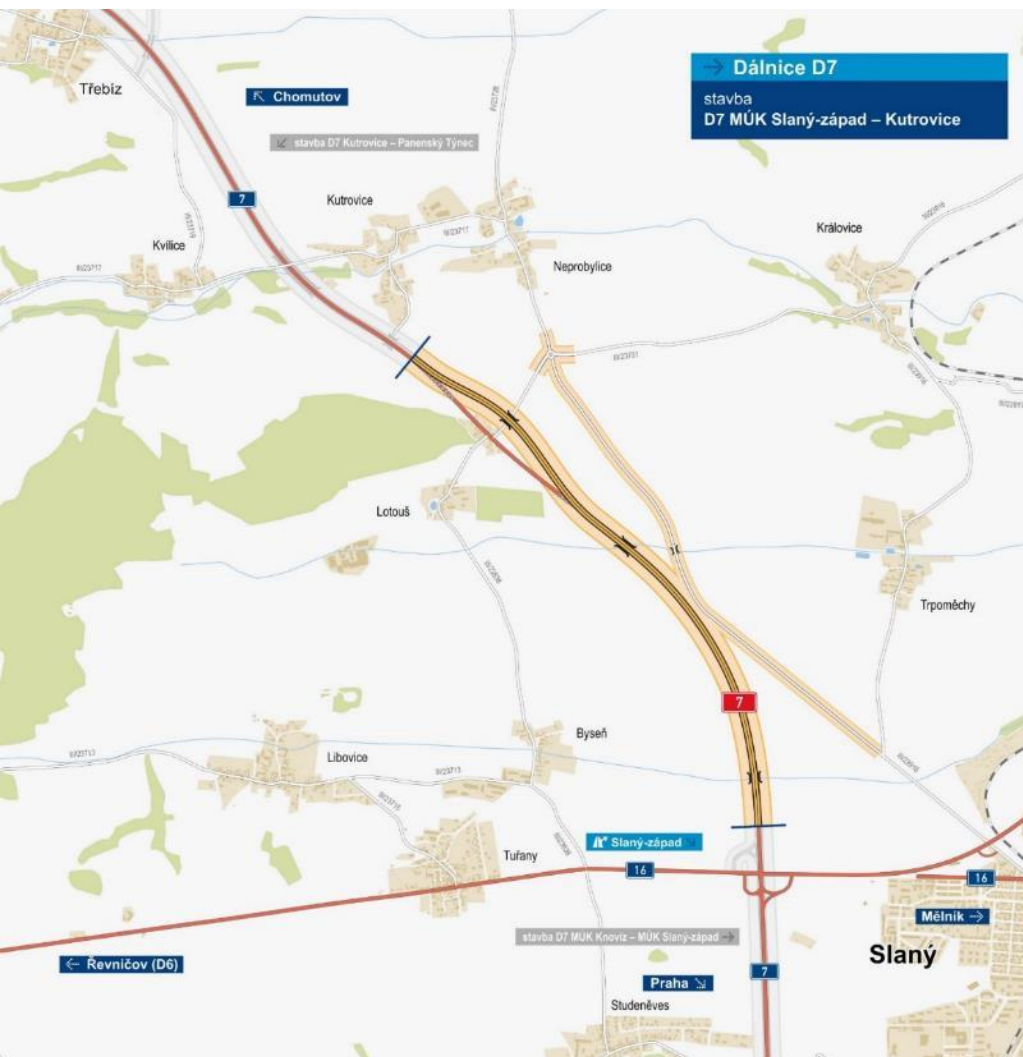

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
12/2005	12/2015	06/2019	09/2022	2023	2024	2026

Stav	V přípravě
Délka (m)	3350
Kategorie	D 25,5/110
Mosty (dálniční)	3
MÚK	
Zhotovitel DSP	Společnost MM: R7 Slaný km 24,300–27,700
Cena (bez DPH)	817 010 000 Kč

DSP

- 10/2022 získána všechna stavební povolení

VD-ZDS

- Čistopis 09/2023


Archeologický průzkum

- 10/23 - 06/24


Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves

D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice


16.10.2023

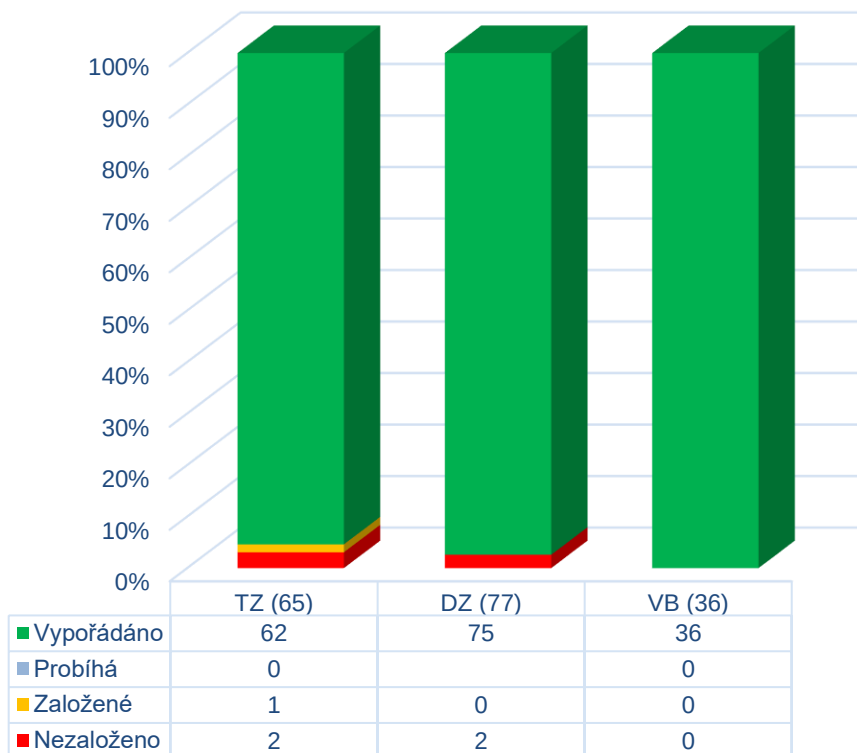

30.5.2023

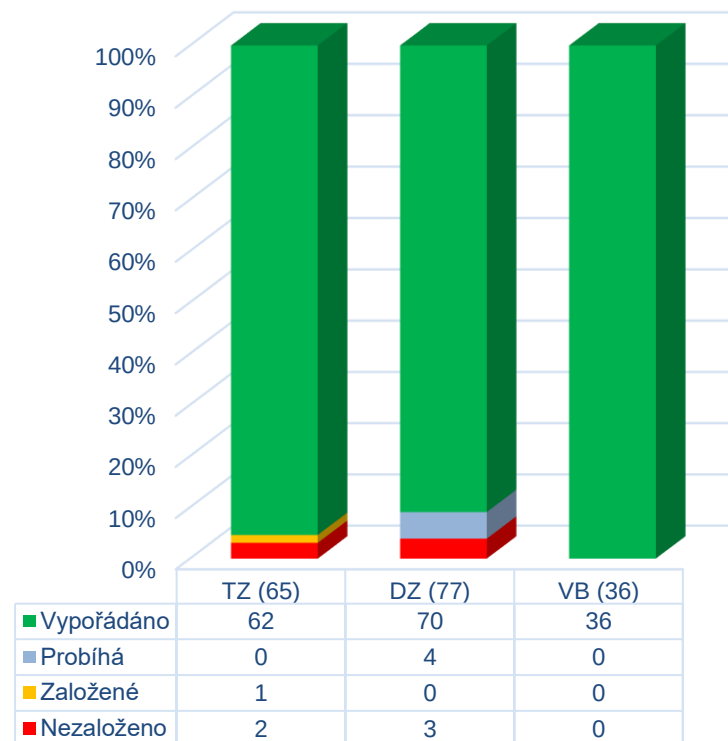

D7 Kutrovice – Panenský Týnec

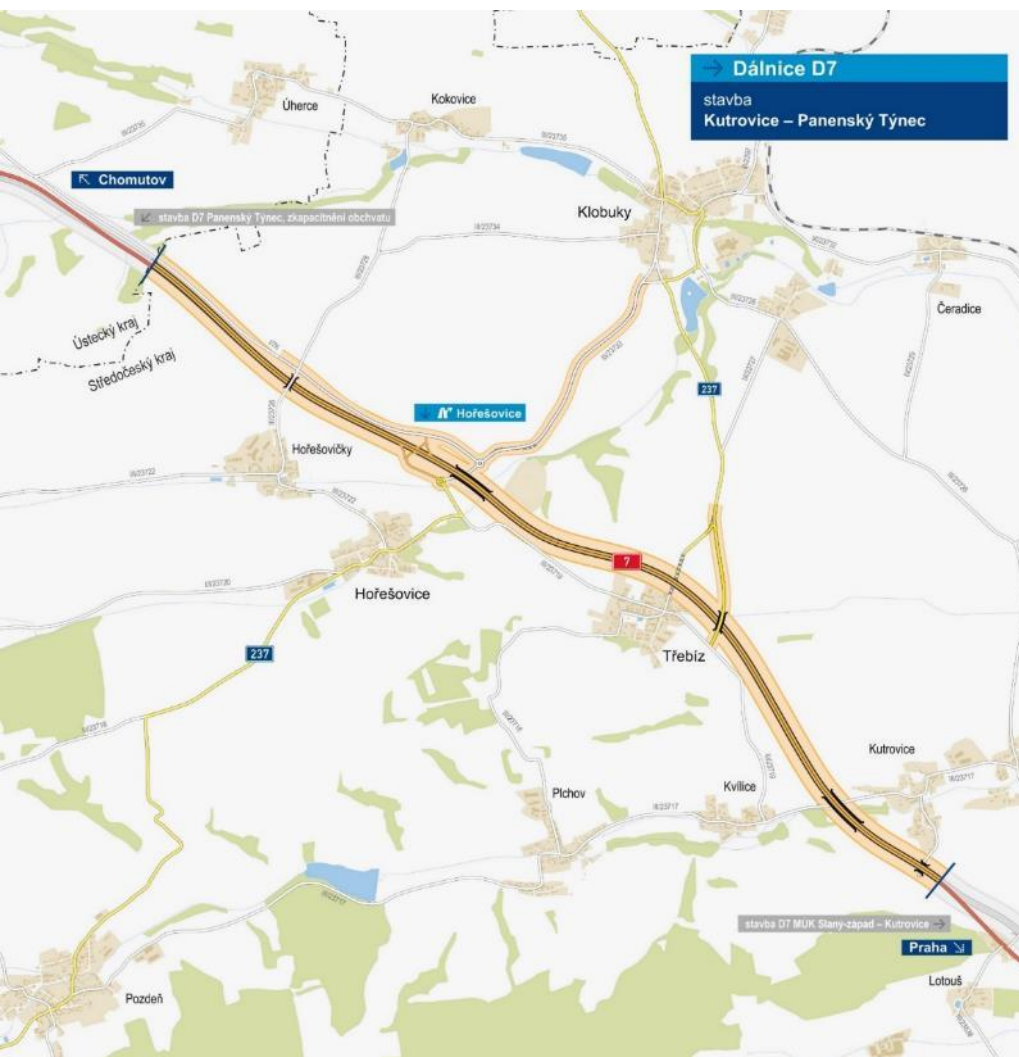

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
12/2005	12/2015	06/2019	11/2022	2023	2024	2026

Stav	V přípravě
Délka (m)	6760
Kategorie	D 25,5/110
Mosty (dálniční)	3
MÚK	MÚK Hořešovice (celková délka větví: 916 m)
Zhotovitel DSP	Sudop Group - 2016 III
Cena (bez DPH)	1 996 368 724 Kč

DSP

- 12/2022 všechna stavební povolení

VD-ZDS

- Probíhá činnost
- Čistopis 12/2023


Archeologický průzkum

- 11/23 - 11/24


D7 Kutrovice – Panenský Týnec

16.10.2023

D7 Kutrovice - Panenský Týnec

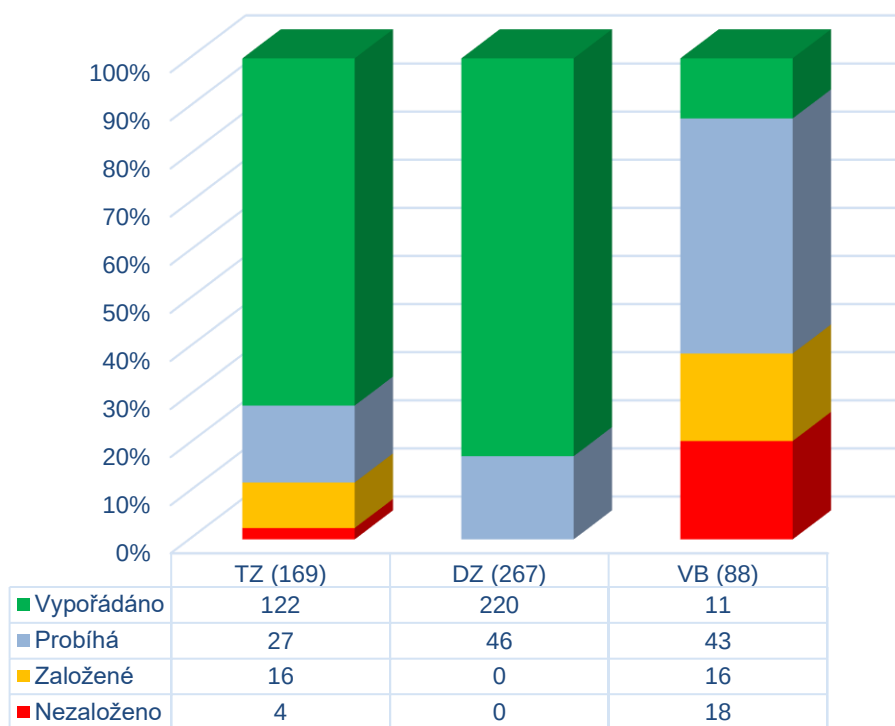

30.5.2023

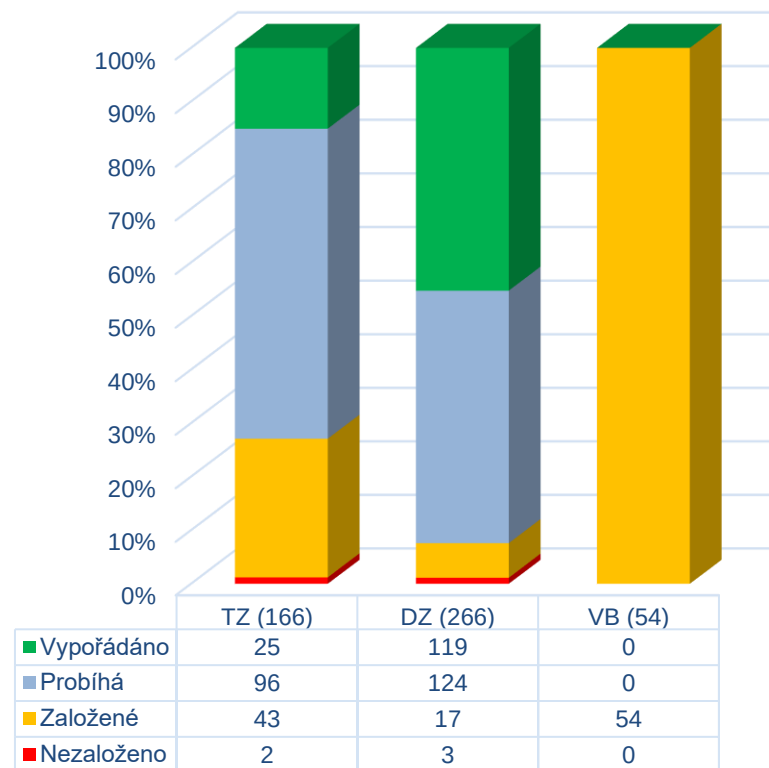

Chlumčany, zkapacitnění



- Částečné zprovoznění dálnice
 - 12/2023
- Úplné uvedení do provozu
 - 8/2024
- Dokončení díla
 - 2/2025
- Zhotovitel
 - Metrostav Infrastructure a.s.



Louny, zkapacitnění obchvatu



- Uvedení dálnice do provozu
 - 20.9. 2023
- Celkové dokončení díla
 - V koordinaci s D7 Chlumčany u MÚK Louny - Východ
- Zhotovitelé
 - EUROVIA CS, a. s.
 - HERKUL a.s.



Postoloprty, zkapacitnění obchvatu



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
11/2005	09/2008	2023	2024	2025	2025	2028

Stav	V přípravě
Délka (m)	4848
Kategorie	D 25,5/100
Mosty (dálniční)	8
MÚK	MÚK Březno (délka větví: 750 m)
Zhotovitel DÚR	Pragoprojekt a.s.
Cena (bez DPH)	2 648 095 323 Kč

Aktualizace DÚR

- 14.9.2022 žádost o ÚR
- 01/24 předpoklad zahájení územního řízení

DSP

- 03/2023 Koncept DSP
- 01/2024 Čistopis DSP

Předpoklad termínů realizací

Knovíz - Slaný

2024 – 2026

Slaný - Kutrovice

2024 – 2026

Kutrovice – Panenský Týnec

2024 – 2026


Postoloprty

2025 – 2028

Webové stránky D7

www.dalnice-d7.cz

☰ Dálnice D7 | Praha - Louny - Chomutov

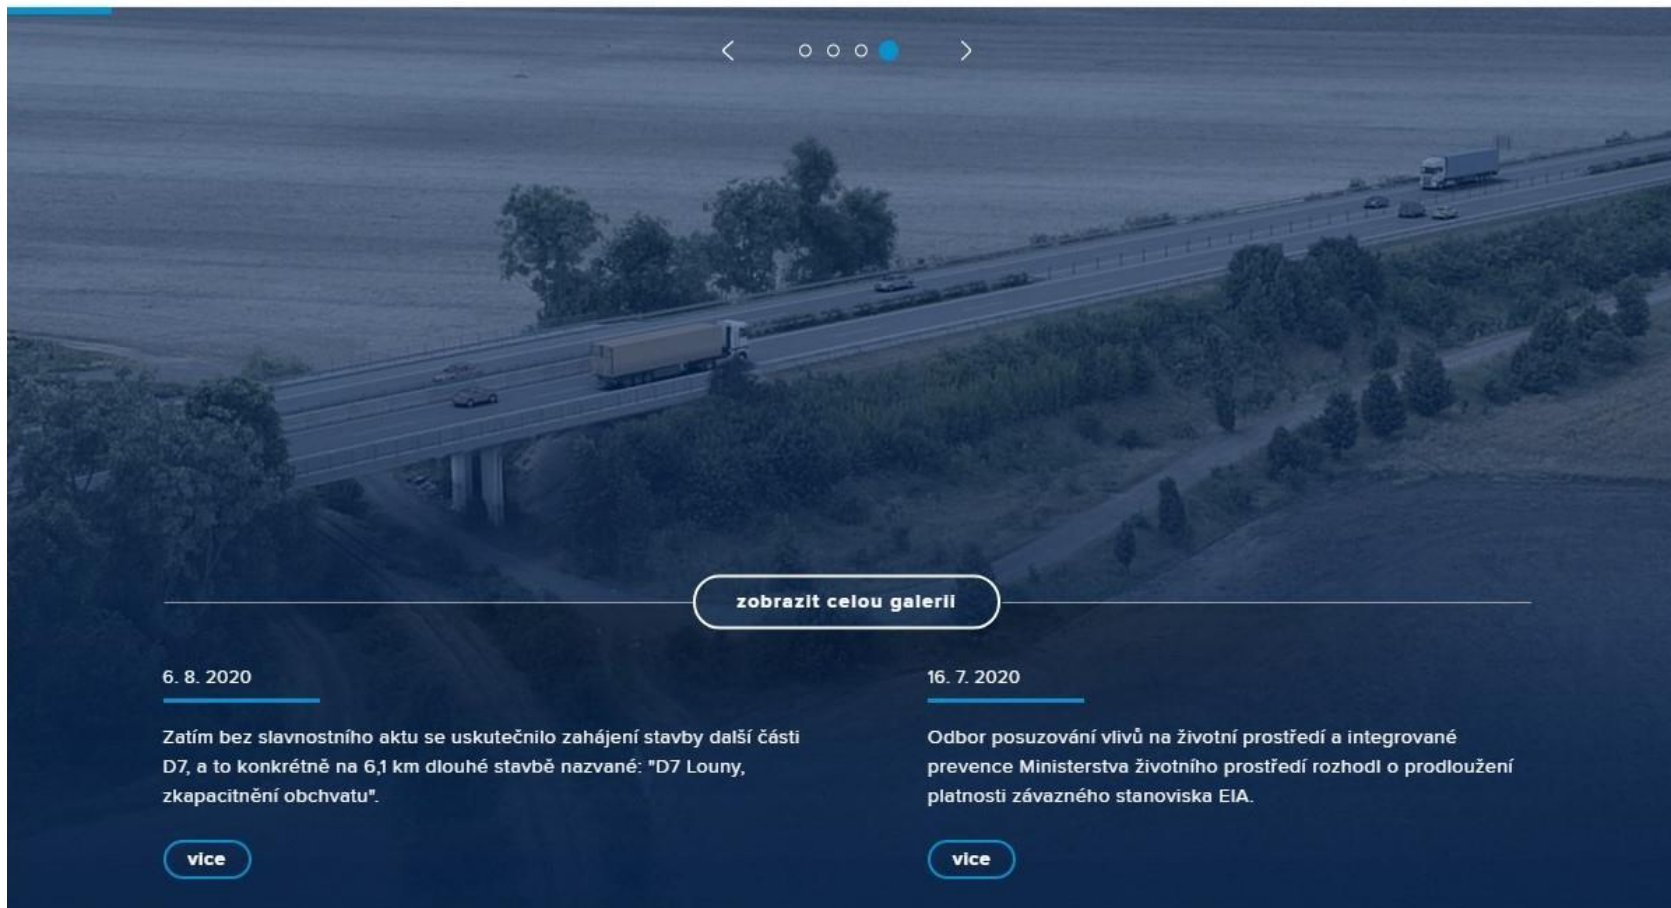

< ○ ○ ○ ● >

[zobrazit celou galerii](#)

6. 8. 2020

Zatím bez slavnostního aktu se uskutečnilo zahájení stavby další části D7, a to konkrétně na 6,1 km dlouhé stavbě nazvané: "D7 Louny, zkapacitnění obchvatu".

[více](#)

16. 7. 2020

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí rozhodl o prodloužení platnosti závazného stanoviska EIA.

[více](#)

Dostavba D7 v úseku Slaný - Bitozeves



#spravnoucestou



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA CHOMUTOV

Děkuji za pozornost ...

KOMOVIA s.r.o., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, www.komovia.cz
